



AI First

MOOVING

Product Implementation Lead

Agosto 2026

Autor: **Luciano Mangiarotti**

Agenda

A

Modelo de gestión

Cómo ordeno el área en régimen

Slides 3 – 5

B

Backlog: estimación, priorización y plan

El núcleo: qué entra, qué no y por qué

Slides 6 – 9

C

Seguimiento de la ejecución

Indicadores, ritual y protocolo ante desvío

Slides 10 – 12

D

Implementación y testing

Mini-caso: 40 tiendas, Core + ERP

Slides 13 – 16

E

Uso de IA en este challenge

Qué delegué, qué verifiqué y qué corregí

Slide 17

+


Anexo: backlog priorizado y plan de 2 semanas

Planilla con los 17 tickets y el Gantt


Adjunto

Parte A: Modelo operativo – Del pedido a producción

El agente produce, el humano firma.



Un solo funnel: Las solicitudes de *stakeholders* ingresan por *intake* y su prioridad se acuerda con el PM.

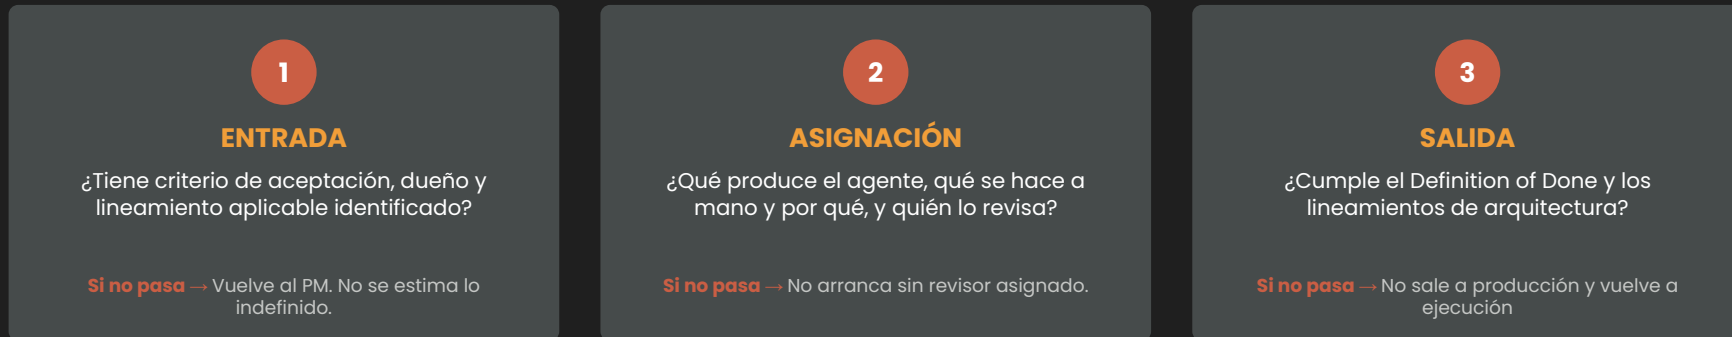

Guidelines y articulación en tres frentes

Alineación de Requerimientos

DIRECCIÓN → EQUIPO

Repositorio vivo de lineamientos que además vive como reglas del agente: linters, checklist de PR, prompt de revisión. El lineamiento no se comunica — se ejecuta.

CLIENTE → EQUIPO

Ficha viva por cuenta —procesos, exigencias, parametrizaciones, SLA— relevada y documentada con IA desde el arranque.

AI First

Colisiones: Escalera de Resolución

- 1 **Parametrización** ¿se resuelve con lo que el producto ya expone?
- 2 **Configuración** ¿se resuelve sin tocar el core?
- 3 **Vía API** ¿se resuelve por el camino estándar de datos?
- 4 **Evolución de producto** ¿sirve a más de un cliente? → PM + Dirección
- 5 **NO fundamentado** con alternativa concreta, nunca “no se puede”

Accountability

Director de Innovación

Arquitectura, excepciones a estándares, deuda técnica estructural

PM

Alcance, prioridades y éxito del producto

Scrum Master

Impedimentos, salud del proceso y del equipo

Product Delivery Lead

Estimación, asignación, secuencia, uso de IA, calidad y “listo o no listo”

Ceremonias y transición al modelo objetivo

Ceremonias mínimas, previsibilidad sin burocracia · La transición avanza por evidencia, no por calendario.

Ceremonias de desarrollo

Daily

Diaria · 10 min

Bloqueos y riesgos, no status · facilita: SM

Planning

Cada 2 semanas · 90 min

Estimar, comprometer y asignar con criterio AI-first · facilita: SM + PDL

Cierre de sprint

Fijo, fin de sprint · 25 min

Estimado vs. real y recalibración · facilita: PDL

Retro profunda

A demanda, por disparador · 60 min

Temas de fondo del proceso · facilita: SM

Disparadores de la retro: incidente en producción · desvío del sprint > 25% · cierre de una implementación · cambio de ola en la transición

Sin reunión: leo tablero y burndown a diario; si hay desvío hablo solo con esa persona, no con el equipo entero.

Lo que no hago: reuniones de status, refinamiento fijo semanal, demo interna separada.

Transición al modelo objetivo: 3 olas por criticidad

1

CALIBRAR

Tickets no críticos: soporte, cosmético, docs, tests

El agente revisa y el humano también.
Doble pasada para medir la precisión real.

2

AMPLIAR

Features estándar y módulos con cobertura de tests

El humano revisa solo lo que el agente marca.

3

CONSOLIDAR

Core, facturación, seguridad e integraciones de cliente

Agente + revisión humana siempre. Acá no se elimina nunca.

Puerta entre olas — se avanza por dato, no por calendario: % de hallazgos válidos del agente · cero escapes a producción en la ola anterior

En paralelo — devs fullstack: cada dev toma 1 ticket de la otra capa por sprint, con agente de soporte y pairing del dev experto.

Por qué esto primero: libera ~50% del tiempo del dev experto, hoy el cuello de botella real del área.

Parte B: Estimación AI-first y capacidad real

Escala: 1 SP ≈ medio día - Persona Efectiva · Sprint de 2 semanas, ausencias cero.

54 SP

Capacidad neta del squad

43 SP

Comprometidos (80%)

11 SP

Buffer para incidentes

Capacidad por perfil

Dev experto / DevOps

-50% review y entornos

10 SP

Frontend senior

-15% ceremonias

17 SP

Backend semi-senior +

-15% ceremonias

17 SP

QA / Soporte junior

-50% soporte diario

10 SP

Dato importante: T-01 falla desde el viernes y la penalidad se dispara a los 5 días hábiles. Quedan 3: vence el jueves de la semana 1.

Estimación AI-first: qué delegar y qué corregir

LO QUE HACE LA IA

Descompone cada ticket en subtarefas, archivos y tests · un agente con los 17 tickets propone el grafo de dependencias · generación de casos de prueba para dimensionar QA

DONDE EL HUMANO CORRIGE

- 1 Subestima el diagnóstico. T-01 no se estima: se acota con timebox de 1 día.
- 2 No conoce el contexto contractual. No sabe que T-14 es la segunda vez que lo reportan.
- 3 Optimiza por ticket, no por sistema. Para T-07 propuso resolver los 45 uno por uno.
- 4 Se descuenta producción y verificación por igual. El ahorro reaparece al revisar: los 5 SP de T-03 son la revisión que nadie presupuestó.

Priorización: qué entra, qué no y por qué

1 SLA con penalidad

2 Exploit conocido

3 Deuda de confianza

4 Compromiso tomado

5 Libera capacidad

6 Costo marginal ~0

ENTRA — 43 SP comprometidos

T-01	Incidente RetailMax	5 SP	BE + Dev exp.
T-09	Seguridad: solo las 2 críticas	7 SP	Dev exp. + BE + QA
T-02	Demo UtilCorp (alcance ajustado)	8 SP	Frontend
T-03	Re-trabajo exportador	5 SP	Backend
T-12	Regresión automatizada	5 SP	QA
T-16	Piloto de PRs con agentes	4 SP	Dev experto
T-07	Triage de soporte con IA	4 SP	QA + FE
T-14	Bug redondeo AgroDist	3 SP	Backend
T-15	Plan de UAT EnerSur	1 SP	QA + agente
T-11	Logo UtilCorp	1 SP	Frontend

NO ENTRA — y qué hago igual

T-10 Alertas WhatsApp

El sacrificio más caro: 3 clientes. Prioridad 1 del sprint 2, comprometida por escrito.

T-04 Refactor de conectores

40 SP y sin aval de arquitectura: nadie lo escaló. Lo escalo el lunes con el diagnóstico de T-01.

T-08 Migración RetailMax

El plazo aguanta 3 semanas. Primer ítem del sprint 2; válido calidad de datos si sobra buffer.

T-09b Las 14 vulnerabilidades medias

Sin exploit conocido. Van al sprint 2, ya con la suite de regresión automatizada.

T-05 Panel ejecutivo con IA

Sin definición no se estima. Workshop de 1 h + prototipo generado con IA. Tiempo mío, no del squad.

T-06 Parametrización EnerSur

El bloqueo es funcional, no técnico. Pido al analista funcional (ver slide siguiente).

T-13 Documentación

No compete: se genera con IA mientras se hace T-06 y T-15. Costo marginal ~0.

La cadena que ningún ticket dice: T-09 no se parchea sin regresión → hoy son 2 días manuales del único QA que tenemos → por eso T-12 entra primero.

Plan de 2 semanas y asignación AI-first

AI First



Cómo se revisa lo que producen los agentes

OLA 1 - no crítico

T-11 · T-07 · T-13

Revisa el agente y también el humano: doble pasada para calibrar el piloto T-16 con trabajo real.

OLA 2 - estándar

T-02 · T-15

El humano revisa solo lo que el agente marca.

OLA 3 - crítico

T-09 · T-03 · T-14 · T-01

Revisión humana obligatoria: Core, seguridad, impacto contable y cliente con penalidad.

Trade-offs: qué comunico, a quién y cuándo

A PM Y DIRECCIÓN · lunes, por escrito

Lo que no llega

T-10 sale del sprint. Es lo más valioso que sacrifico: 3 clientes y roadmap del trimestre. Lo comprometo como prioridad 1 del sprint 2, con fecha, y lo comunicamos ahora — no cuando pregunten.

Cambio alcance, no fecha

T-02: sostengo la demo del viernes con recorrido acotado y datos preparados. Necesito que acordemos hoy qué tiene que ver el cliente sí o sí; el jueves hago dry-run y ahí ya no hay margen.

Lo doy vuelta

T-05 no va a desarrollo porque no tiene definición. Llevo un prototipo navegable generado con IA a una sesión de 1 hora. En una tarde tenemos más claridad que en tres semanas de preguntar cómo viene.

Lo que escalo

T-04 lleva semanas sin aval de arquitectura porque nadie lo escaló. Lo escalo hoy, con el diagnóstico de T-01 como evidencia.

A UTILCORP · miércoles, después de alinear internamente

Flujo de aprobación propio → camino alternativo

Un producto bifurcado hace que cada actualización de seguridad les llegue más tarde y más cara que al resto, por eso no nos parece la mejor alternativa hacer una versión del Core exclusiva para ustedes.” Relevamiento el jueves; propuesta como capacidad configurable del producto.

Acceso directo a la base de datos → NO

“Nuestro esquema interno cambia sin previo aviso porque es interno: el día que construyan reportes sobre esas tablas, cualquier mejora nuestra se los rompe en silencio. Y un acceso directo los deja sin trazabilidad de quién consultó qué.” Alternativa: endpoints de lectura con contrato estable y versionado.

El pedido detrás del pedido

No necesitan la base: necesitan sus reportes. Pido los 3 o 4 prioritarios y devuelvo propuesta técnica con fecha. Y lo mando después de alinear con el Director y el PM, proponiendo reunión: un “no” por mail se lee como rigidez; el mismo “no” con una alternativa sobre la mesa se lee como criterio.

PEDIDO FORMAL DE ANALISTA FUNCIONAL SEMI-SENIOR PARA ENERSUR — EL CRITERIO

Por qué lo pido

El bloqueo es funcional, no técnico: sumar backend no lo destraba y hoy me consume el recurso más escaso.

Qué está en juego

Go-live comprometido en 4 semanas. Trabado hace 3 días esperando definiciones del cliente.

Cuándo lo necesito

Decisión esta semana. Después del día 5 ya no llega a preparar el UAT que el cliente pidió ver.

Si la respuesta es no

Lo cubro yo 1 día por semana y dejo asentado por escrito que el go-live queda en riesgo.

Parte C: Tablero, indicadores y ritual de seguimiento

El burndown es el pulso; el gatillo es siempre la edad del ticket individual.

Todos los días

Burndown de SP

Solo se mueve cuando algo termina: una línea plana el día 3 es ambigua. Traza aparte el alcance agregado por incidentes.

Referencia visual — nunca gatillo

Edad del ticket en curso

Días en curso sobre su estimación, con tope absoluto para que el ticket largo no se detecte tarde.

Ámbar 1,2× · Rojo 1,5× o +2 días, lo que pase primero

WIP por persona

El predictor más temprano de un burndown malo: se ve el día 2, no el día 5.

Límite: 1 por persona · 2 con justificación

Todas las semanas

Velocity — SP completados

El ancla para dimensionar el próximo sprint. Se compara contra lo comprometido, no contra la capacidad bruta.

Sprint 1 es medición, no verdad

% de re-trabajo desde QA

Tickets que vuelven sobre entregados. El contrapeso obligado de un equipo AI-first.

Línea base: las 12 fallas de T-03

SP en curso al cierre

Cerrar 35 SP sin nada en el aire es mejor que cerrar 35 con 15 abiertos.

Evita premiar lo chico

Mi rutina

09:50 · 10 min

Leo el tablero

Con el resumen del agente ya generado

10:00 · 10 min

Daily del equipo

Bloqueos, no status: el status ya lo lei

Si hay señal

Uno a uno

Con quien tiene el desvío. Nunca ante el equipo

Vie · 20 min

Corte semanal

Velocity parcial, re-trabajo y riesgos

Día 10 · 25 min

Cierre de sprint

Estimado vs. real y recalibración

Tres alarmas que se encienden solas — nadie me reporta cómo viene: la persona solo me ve aparecer cuando algo pasa de verdad.

1 EDAD

Ámbar a 1,2×: solo observación. Rojo a 1,5× o +2 días: dispara el protocolo. El tope acota el retraso a 2 días en cualquier ticket.

2 WIP

Más de un ticket en curso por persona. Antes de que el burndown lo muestre.

3 SILENCIO

24 h sin commit, sin PR, sin cambio de estado. Detecta la contradicción entre lo que se dice y lo que se hace.

Protocolo ante desvío: el ticket que va por el día 4

Un ticket de 2 días no llega al día 4: ámbar a 1,2× (solo observación) y rojo a 1,5× o +2 días, lo que ocurra primero.

Los 4 pasos

1 ÁMBAR · observación, sin conversación

A 1,2× el agente vigila commits y PRs y yo miro la evidencia. Nadie se entera: detectar temprano no obliga a intervenir temprano.

2 ROJO · diagnóstico, 10 min

Uno a uno, nunca delante del equipo. Llego con hipótesis, no con "¿cómo venís?". Una sola pregunta: la de la derecha.

3 DECISIÓN · el mismo día

Cuatro opciones, en orden. La decisión es mía, no de quien está trabado.

4 COMUNICACIÓN · el mismo día

Al PM si mueve alcance, al cliente si mueve una fecha comprometida.

Paso 2 · La pregunta que ordena todo

¿Es un problema de estimación, de conocimiento o de bloqueo externo?

ESTIMACIÓN

Subestimamos el alcance.

Re-estimo y el impacto va al plan:
algo tiene que salir.

CONOCIMIENTO

Falta contexto o herramienta.

Pairing con el dev experto o con el
agente. Hoy, no mañana.

BLOQUEO EXTERNO

Falta una definición, un acceso,
una respuesta.

Es mía: lo destrabo o lo escalo el
mismo día.

Paso 3 · Las 4 opciones, en este orden

1 **Reducir alcance** · Partir el ticket, entregar el núcleo, diferir el resto

2 **Cambiar el enfoque** · Evaluar si se necesita intervención humana en caso de que el problema sea el agente. La excepción se documenta

3 **Sumar pairing** · Solo si el diagnóstico fue conocimiento. Nunca "más gente al ticket"

4 **Sacarlo del sprint** · última opción, pero es una opción real

Estimado vs. Real, recalibración e IA en el seguimiento

Cierre de sprint: Se separan dos causas

ERROR DE ESTIMACIÓN

SP estimados vs. re-estimados al cierre, ticket por ticket. ¿El de 5 en realidad era de 8?

PÉRDIDA DE CAPACIDAD

SP planificados que no se tocaron porque entró trabajo no planificado: incidentes y soporte.

Cómo recalibro

- 1 **Velocidad como ancla** • El próximo sprint se dimensiona en una cantidad similar o levemente superior.
- 2 **Por perfil para planificar** • Se sugiere mirar principalmente la *velocidad* grupal y luego también la individual.
- 3 **Velocidad tendencial** • Tomar entre las últimas 3 a 5 sprints para estimar una velocidad promedio y su tendencia.

IA en el seguimiento

LO QUE DELEGO

- Resumen diario de avance cruzando tablero + commits + PRs — no solo el tablero
- Detección de anomalías y desvíos sobre el tablero
- Redacción completa del reporte quincenal a Dirección


LO QUE NO DELEGO NUNCA

- 1 La conversación con quien está trabado
- 2 La decisión de sacar algo del sprint
- 3 El número que le comprometo a un cliente o a Dirección
- 4 La lectura del ánimo del equipo — un resumen no ve que alguien está quemado

Si bien el reporte quincenal a Dirección lo realiza la IA, la aprobación final es el PDL. La misma se realiza leyendo los datos crudos, no el resumen.

Parte D: Implementación de punta a punta – 40 tiendas, Core + ERP

14 semanas hasta el go-live completo · Piloto en 3 tiendas y salida en 2 olas

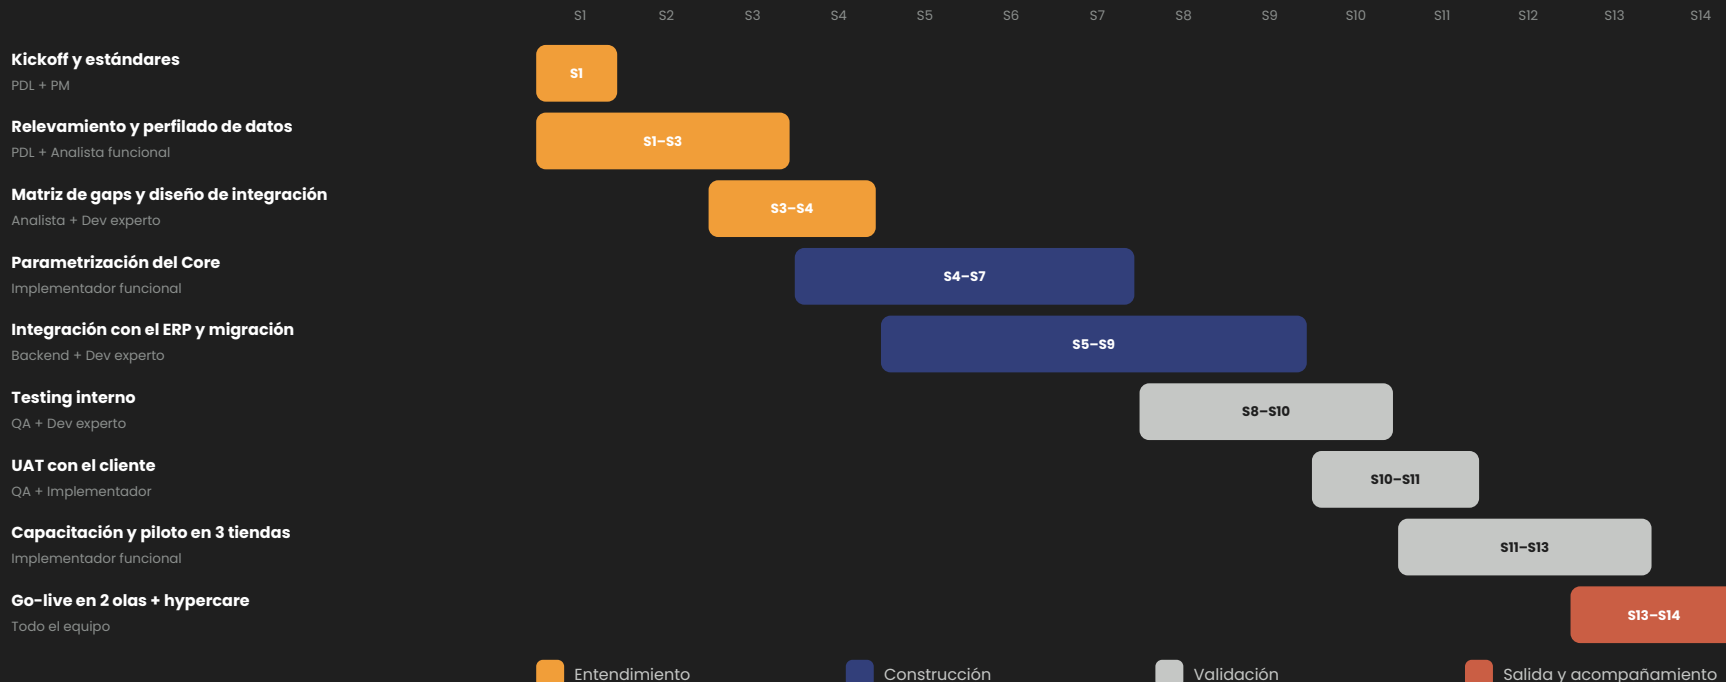

El 40% del riesgo vive en las 3-4 primeras semanas: Si los requerimientos, restricciones y configuraciones no quedan bien definidos ahí, todo lo que viene después se construye sobre una duda.

Relevamiento y alineación de lineamientos

¿Cómo relevamos?

1 Ficha de estándares del producto

Generada con IA desde el código y desde la configuración de los 6 clientes en producción: qué parametriza el producto hoy, qué no, y cómo lo resolvieron los otros.

2 Cuestionario derivado de esa ficha

Una pregunta por cada punto de parametrización. Cobertura del 100% de lo configurable: lo que queda afuera es, por definición, un gap.

3 Observación, no solo entrevista

2 días en tienda + un mes de movimientos reales del ERP analizados por un agente. Lo que el cliente dice que hace y lo que hace difieren.

4 Taller con datos reales

Se toma un pedido real y se lo sigue punta a punta. Es donde aparecen los gaps que ninguna entrevista revela.

Las preguntas que definen el proyecto

STOCK - 40 TIENDAS

La sincronización del stock se escala al Director de Innovación: es arquitectura, no negociación. Al cliente le preguntamos cómo opera, no cómo diseñar.

- ¿Qué sistemas modifican hoy el stock: ERP, punto de venta, planillas, ajustes a mano?
- Cuando llega mercadería o se vende, ¿dónde se registra primero?
- Si el sistema dice 10 y en el estante hay 8, ¿quién corrige y dónde?
- ¿Cómo se manejan transferencias entre tiendas y devoluciones?
- ¿Se puede vender sin stock? ¿Se compromete al pedido o al pago?

FACTURACIÓN

- ¿Cómo se numeran hoy los comprobantes y qué sistema los emite?
- ¿Facturación por tienda o centralizada?
- Redondeo y descuentos combinados: reglas exactas y validación contable

Matriz de gaps — 4 salidas: se parametriza · lo ajusta el cliente · se escala a Dirección y Producto como evolución · no se hace, siempre fundamentando

Testing y documentación AI-first

El agente produce y precorre; el humano firma todo lo que toca dinero, stock o datos del cliente.

Qué se testea, cuándo y quién

Regresión del Core

antes de cada despliegue

Suite automatizada (T-12). El agente la genera y mantiene; el QA cura los casos de facturación.

Integración con el ERP

cada cambio del conector

Contratos y casos de borde generados desde el mapeo. El dev experto revisa: es la pieza crítica.

Seguridad

automático en el pipeline

Dependencias, secretos y superficie de API. Pentest acotado humano antes del go-live.

Carga y escalabilidad

antes de firmar arquitectura

Escenarios a 80 tiendas, no a 40. El agente los genera; el dev experto interpreta.

UAT interno

antes del UAT del cliente

Recorridos end-to-end con datos reales. El agente precorre; QA e implementador validan.

UAT del cliente

semanas 10 y 11

El agente precorre el happy path; los key users ejecutan a mano lo crítico de su operación.

UAT y documentación

UAT CON EL CLIENTE - QUIÉN HACE QUÉ

Agente: plan de UAT, datos de prueba, precorrida del happy path y consolidación

QA junior: cura los casos críticos de stock y facturación, valida los hallazgos

Key users: ejecutan a mano los recorridos de su operación real, en sus tiendas

Delivery Lead: define el criterio de aceptación y qué hallazgo bloquea el go-live

El cliente no ensaya: se apropia. Por eso el agente le saca del camino los bugs triviales, pero no ejecuta por él.

DOCUMENTACIÓN AI-FIRST

El código fuente es la fuente primaria: de ahí se derivan la doc funcional, la de integración y la de parametrizaciones. Se genera durante, no al final.

Ficha de cuenta — las parametrizaciones de este cliente

Manual de operación — para los key users de las 40 tiendas

Ficha de estándares — actualizada para el próximo cliente

El criterio de profundidad no depende de quién escribió el código, sino de qué toca: dinero, stock y datos del cliente llevan ojos humanos siempre.

Riesgos enterprise y criterio de go-live

Riesgos y mitigación

1

Doble fuente de verdad del stock

Dueño único por dato definido en el relevamiento + reconciliación diaria automática con alerta

2

Calidad de los datos maestros

Perfilado con IA en la semana 1, no durante la migración. Es la causa #1 de go-lives caídos

3

Límites del ERP del cliente

Prueba de carga contra su sandbox antes de firmar la arquitectura de sincronización

4

Escalado por crecimiento de tiendas

Se diseña y se prueba a 80 tiendas, no a 40

5

Seguridad

Escaneo en pipeline, secretos en vault, mínimo privilegio y pentest acotado antes del go-live

6

Disponibilidad

Nombres y horas comprometidas por escrito en el kickoff. Es la causa más común de atraso

7

Scope por tienda

Se releva 1 tienda tipo + 2 atípicas. Las excepciones se escalan, no se implementan

8

Estacionalidad y rollback

Ventana acordada en el kickoff + plan de rollback probado, no escrito

Listo para go-live: qué tiene que estar verde



Tests automáticos en verde

regresión, integración, seguridad y carga sobre el release candidato



UAT interno cerrado

cero defectos críticos abiertos



UAT del cliente firmado

100% de los recorridos críticos ejecutados por los key users



Matriz de gaps cerrada

cero gaps abiertos: parametrizado, ajustado, escalado o descartado



Demo presentada y OK por escrito

aceptación formal del cliente



Datos validados

reconciliación de stock con divergencia cero durante 3 días seguidos



Piloto superado

3 tiendas operando 2 semanas sin incidente crítico



Rollback probado

ejecutado en un simulacro, no solo documentado

Cuatro firmas para salir: Dirección de Innovación (arquitectura) · Producto (evoluciones comprometidas) · Delivery · Cliente (por escrito)

Parte E: Uso de IA

Herramienta y Método

- Claude Cowork (Opus 5), una sola herramienta de punta a punta
- Primero el contexto completo del challenge; después un prompt por parte
- En cada parte: mis restricciones, mis criterios y qué quería que validara conmigo antes de producir
- Salida a .pptx y .xlsx generados por código, no maquetados a mano

Qué verifiqué y qué corregí

Estimación con IA

Propuso: "las estimaciones no se reducen por usar agentes; T-02 y T-03 son la evidencia".

IA corrigió: es un salto lógico. T-03 prueba que la IA sin gobierno genera re-trabajo, no que no acelere. Quedó: reduce producción, no verificación.

Gatillo de desvío

Propuso: un múltiplo fijo de 1,5x la estimación.

IA corrigió: con múltiplo fijo, cuanto más grande el ticket más tarde se detecta. Quedó: 1,5x o +2 días, lo que ocurra primero, con nivel ámbar sin conversación.

Relevamiento del cliente

Propuso: preguntarle al cliente cuál es la fuente de verdad del stock.

IA corrigió: no es una pregunta del cliente ni la puede responder bien. Es arquitectura, y se escala al Director de Innovación.

Modelo operativo

Propuso: el flujo de trabajo arrancaba en "pedido del PM".

IA corrigió: en este rol el pedido del cliente llega directo. Quedó: entrada multi-origen con un solo embudo.

Ejemplo de prompt

Ahora quiero que nos enfoquemos en la Parte C. Para esta parte quiero que armemos 3 o 4 slides, no menos de 3 y no más de 4. Va a depender de las necesidades. Antes de armar dichas slides quiero que valides conmigo todas las decisiones que tomes. Para el armado de esta parte C quiero que tengas en cuenta las siguientes consideraciones de mi parte:

- Respecto a los indicadores me gusta ver el burndown de SP. Esto lo revisaría diariamente para ver cómo viene el equipo entre SP realizados y pendientes. 2 semanas son 10 días y deberíamos avanzar en promedio un 10% diario. Semanalmente miraría cuántos SP se completaron para entender el velocity rate del equipo y en futuras sprints apuntar a valores no muy lejanos de eso (mejora en las estimaciones).
- Como ritual de seguimiento miraría el tablero en la daily stand up del equipo y revisaría ahí los SP. Esto se empalma con el control de desvíos, intentaría siempre detectar que no se llegue al día 4 para un ticket estimado en día 2. Respecto al paso a paso en este caso que me sugerís? Plantea una solución y la reviso.
- Respecto a estimado vs real uso los SP y el velocity rate. Miro que % de SPs se resolvieron y esa es la tasa de resolución del equipo. Luego, para recalibrar miro la velocidad del equipo (SPs resueltos) por cada perfil y apunto a la próxima sprint incluir una cantidad similar o levemente superior. Qué pensás de mi idea?
- Respecto al uso de IA, le confío 100% los resúmenes de avance. Si hay anomalías reviso yo siempre. Los reportes a dirección se los delego a la IA pero yo los tengo aprobar explícitamente

En base a estos bullets, hazme las consultas y validaciones necesarias y una vez que hayamos resuelto eso, ahí armá las 3 o 4 slides solicitadas por favor

Anexo 1: Backlog Priorizado + Gantt

En el siguiente [link](#) se muestran dos tabs:

- Backlog Priorizado
 - En este archivo se muestran las tareas que ingresan a la Sprint y cuáles no. Siempre indicando las justificaciones y el criterio.
- Gantt 2 semanas
 - Se muestra día por día que tarea toma cada uno de los perfiles del equipo. Esta tab nos permite apreciar claramente qué tareas son paralelizables

AI First

MOOVING

¡Muchas Gracias!

Agosto 2026

Autor: **Luciano Mangiarotti**
